

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
Septiembre
 FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU010Z


 Planeación
 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342114 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

 Obras y Mantenimiento
 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@predug.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipo	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
9	Continuación de Construcción Sede Tomatán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)	X					\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00		Aulas/salones 12 748.24 Sanitarios 2 68.47 Áreas comunes 5 614.37 Otros 2 24.14 TOTAL 21.00 1455.22	Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo.	*Entregar a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos. *Armados de acero para distintos elementos estructurales	0	02/10/18	25/12/18									
10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11		X			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00		Preliminares de instalaciones sustentables: pvc con contenido de biocidas, (polipropileno, polibuteno y polietileno) 855 0.00 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco regradados con cementantes 634 0.00 TOTAL 1489.12 0.00	Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo.	Entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos y realizar localización de punto de georeferencia, trazo en sitio del polígono del edificio. Preliminares, (limpieza de terreno, (despalmas, excavaciones rellenos) Cimentación (plantillas, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbras comunes, suministro y colocación de concreto premezclado, colocación de muro a tezon de block de jalisco para nivelación de cimentación, anclaje de castillos, suministro y colocación de impermeabilizante) y Estructura (suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbras comunes, suministro y colocación de concreto premezclado)	0	02/10/18	25/12/18									
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16	X				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00		Auditorios 1 720.00 TOTAL 1.00 720.00	Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo. Se entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos.	Obra civil y acabados en muro sur, oriente y poniente, ventana norte, puertas de acceso, instalación de piso y zócalo, impermeabilización e instalaciones electromecánicas, pluviales e hidráulicas.	0	05/10/18	18/12/18									

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU010Z

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@coplad@udg.mx

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@predudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipo	Equipamiento	Adquisiciones y migración				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/Equipo				Cantidad	Metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)
12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	Talleres	2	210.00	Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo. Se entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos.	Realizar trazos de andadores, plazoleta, y línea eléctrica. Forjado de plazoleta de ingreso. Desplante y excavación para algar tubería de tendido eléctrico, así como registros. Desplante y confinamiento para construir el andador de liga de la plazoleta.	0	03/10/18	21/12/18							
								Laboratorios	12	680.00													
								Oficinas académicas	1	26.00													
								Aulas didácticas	3	156.00													
								Sanitarios	2	52.00													
								Áreas comunes	4	763.00													
								Otros	3	105.00													
								TOTAL	27.00	1992.00													
13	Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI) FAM 2018 P-22	X				\$ 4,532,644.16	\$ -	\$ 4,532,644.16	Laboratorios	5	817.39	Obra adjudicada.	En proceso de iniciar obra.	0	10/10/18	30/12/18	Anticipo por pagar, para el inicio de los trabajos.						
								Cubículos	12	436.39													
								Sanitarios	4	41.51													
								Otros	12	904.71													
								TOTAL	33.00	2200.00													
						\$45,644,268.16	\$3,347,223.67	\$42,197,045.59															

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **2**

Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista,
Código Postal 47820, Ocotlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada, se entregó anticipo al contratista, se realiza la entrega del inmueble y se programa la reubicación de los alumnos para entregar el área de trabajo a la empresa.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Esquivel
Coordinador de Servicios Centrales de la Dirección General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 28/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **10** Nombre de la obra:

Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán, Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Por realizar el pago del anticipo y realizar los trabajos preliminares, comenzando con la localización del punto georeferenciado para el trazo general.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

11

Nombre de la obra: **Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

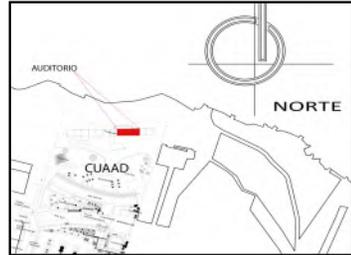

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo. Se entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 28/09/18

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

12

Nombre de la obra:

**Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE)
FAM 2019 P-25**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México

FOTOS



F 1,2,3 Y 4: Plazoleta



F 5,6 Y 7: Trazo de andador de conexión y ppal.

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo, para realizar trazos.



F 8 Y 9: Trazo de línea eléctrica en baja tensión



F 10: Trazo de línea media tensión



F 11: Ubicación de transformador y línea de media tensión

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD



13

Nombre de la obra:

Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI)

FAM 2018 P-22

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

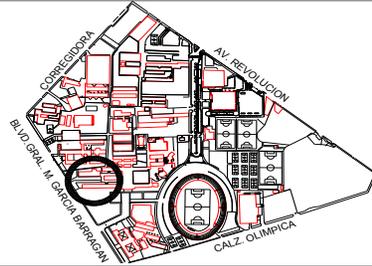

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421, Esquina Calzada Olimpica C.P 44430, Guadalajara, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de pago del anticipo para el inicio de los trabajos.



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ARQUITECTÓNICA
PLANTA



Referencia de la obra en Google Earth



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. La Paz No. 2453
Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco.



Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Suministro y colocación de módulo fotovoltaico y suministro y colocación de lámparas para alumbrado público solar, para el Sistema de Universidad Virtual

Dr. Miguel Ángel Javarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Jag. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes,
C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada, en proceso de firma de contrato y pago de anticipo.

Dr. Miguel Ángel Nyárrro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Centrales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: **CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14**



Escudo de la universidad

0

Porcentaje de avance

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460, Lagos de Moreno, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de Licitación. Se muestran imágenes de los espacios a intervenir con los temas de sustentabilidad.



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre


FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes,
C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada, en proceso de firma de contrato y pago de anticipo.

Dr. Miguel Ángel Nyárrro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Centrales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra: **CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

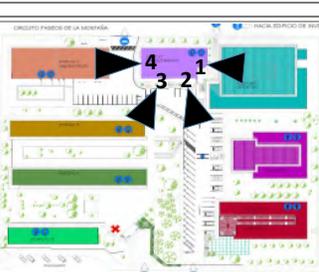

Referencia de

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460, Lagos de Moreno, Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
En proceso de Licitación. Se muestran imágenes de los espacios a intervenir con los temas de sustentabilidad.



F3: Fachada posterior

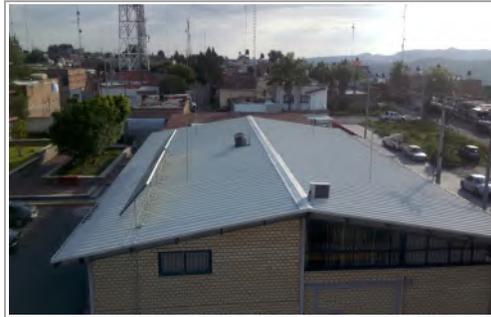

F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 28/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

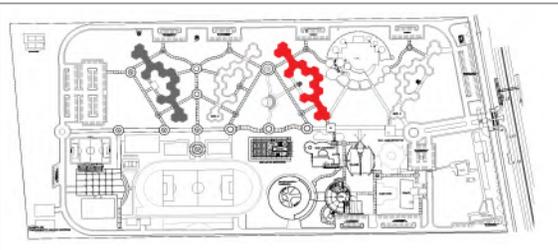

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de licitación.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

6

Nombre de la obra: **Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA), (CUCBA) FAM 2019 P-16**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

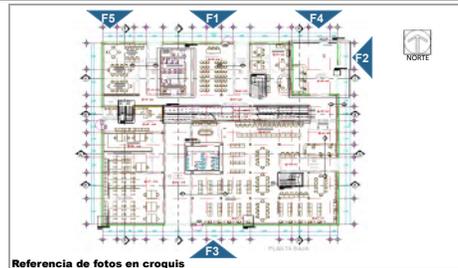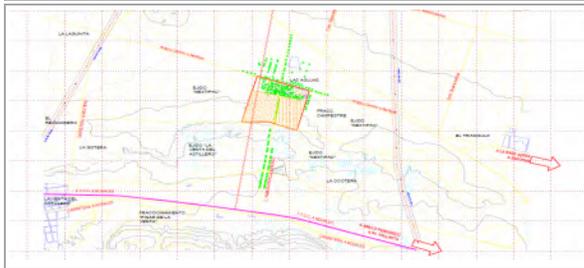

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

1

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Se muestran imágenes de los avances que se tienen en la etapa previa. Trazo y nivelación, cimentación y Estructura de acero.

Los trabajos que se realizaran en esta tercera etapa son la habilitación de la estructura de la cubierta del Nivel 1 y del Nivel 2. Se inicia con habilitación de estructuras en taller.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

7

Nombre de la obra: **Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)**



FAM 2018 P-17



Escuela de la universidad

1

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se han realizado trabajos de delimitación del area de trabajos.
Habilitación de ingresos al area de trabajo.
Preparacion de la superficie de trabajo.
Inicio de trazo y nivelación
Inicio de trabajos de excavacion



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra: **Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México



Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Adjudicado, en proceso de iniciar obra.


Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES


Mgs. Sotaban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **9**

Nombre de la obra: **Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)**





Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo. Se entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Anguila Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **7**

Nombre de la obra: **Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR)**



FAM 2018 P-17



Escuela de la universidad

1

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se han realizado trabajos de delimitación del area de trabajos.
Habilitación de ingresos al area de trabajo.
Preparacion de la superficie de trabajo.
Inicio de trazo y nivelación
Inicio de trabajos de excavacion



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra: **Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,
C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México



Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Adjudicado, en proceso de iniciar obra.


Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES


Dr. Sotaban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre
FECHA DE CORTE: 25/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **9**

Nombre de la obra: **Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)**





Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

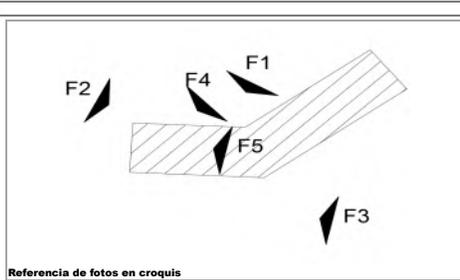

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra adjudicada en proceso de pago de anticipo. Se entrega a la contratista el espacio para el inicio de los trabajos.

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Anguila Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
