

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: 3er Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/09/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (6)



Nombre: (9) Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: (5) Jalisco

Clave 911: (5) 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

Planeación (6)

Obras y Mantenimiento (7)

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1601 y 1602
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns for project name, type, contract details, amounts, physical spaces, and completion status.

Signature box for Ing. Esteban Segura Estrada, Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara.

Signature box for Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez, Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara.

Signature box for Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, Rector General de la Universidad de Guadalajara.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


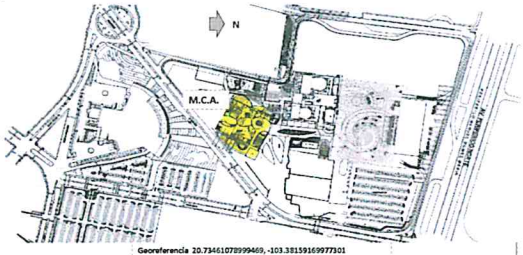
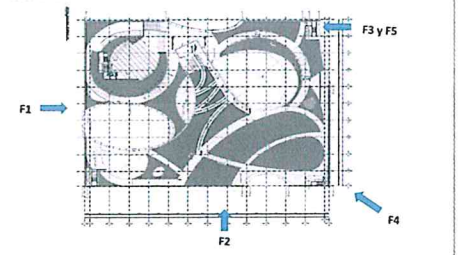

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/09/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


 <p>Porcentaje de avance</p> <p>17%</p>	<p>PRIORIDAD 1</p> <p>Nombre de la obra: Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Sexta etapa)</p>	<p>REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</p>	
	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)</p>  <p>Georeferencia 20.73461072999409, -103.38159169977101</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p>  <p>Dirección Postal: Periférico Norte N° 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco</p>

FOTOS



Observaciones: (11)

Se avanza de acuerdo a lo programado.

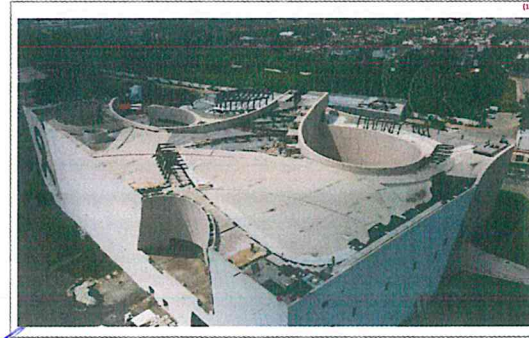

(12)

[Signature]

Mtra. Estelita Segura Estrada
Coordinadora de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

(13)

[Signature]

Mtra. Raquel Lección Corona Guzmán
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

(14)

[Signature]

Dr. Ricardo Vismuñoz Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/09/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


50%

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Centro de Recursos Informativos -CERI- (CUCBA) Sexta Etapa


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

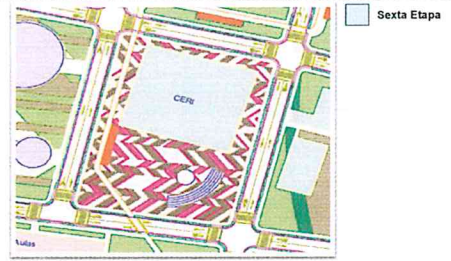

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección: Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, C.P. 45200 Nextipac, Zapopan, Jalisco México..

FOTOS



F1.- Actual:



F2.- Actual:

Observaciones : (11)
Estado actual de la edificación:



F3.- Actual:



F4.- Actual:



F5.- Actual:

[Signature]
Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Miry Pineda López-Gómez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
