

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: 4to Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Clave B11: 14MSU00102

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Paola Lyceño Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns for project name, type, contract details, equipment, progress, and completion status. Includes rows for 'Construcción del Museo de Ciencias Ambientales' and 'Centro de Recursos Informativos - CERI - (CUCBA) Sexta Etapa'.

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara

Mtra. Paola Lyceño Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


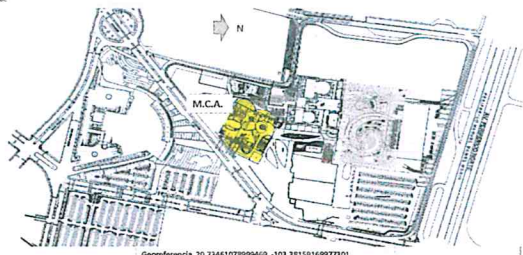
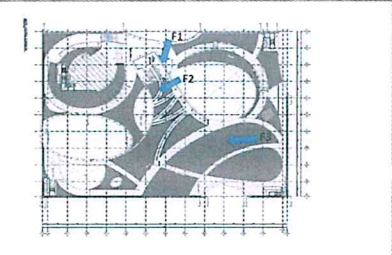

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 100%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (6ta etapa)	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)  <small>Georeferencia 20.73461078994403, -103.38159169977301</small>	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Periférico Norte N° 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco
	FOTOS			



f1 Barandales y sellos, escaleras servicios Anterior



f2 Lambrines prefabricados Anterior


Observaciones: (11)
Se muestran los alcances de los contratos.



f1 Barandales y sellos, escaleras servicios Actual



f2 Lambrines prefabricados Actual

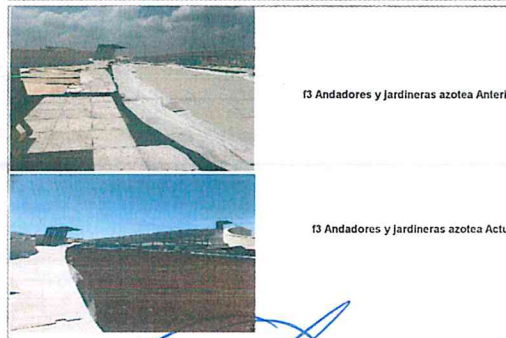

f3 Andadores y jardineras azotea Anterior

f3 Andadores y jardineras azotea Actual

[Signature]
Ing. Esteban Mejía Estrada
Coordinador de Construcción y Mantenimiento de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Paola Lycolette Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Control de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Jimell
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

PRORIDAD 5 Nombre de la obra: Centro de Recursos Informativos -CERI- (CUCBA) Sexta Etapa


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

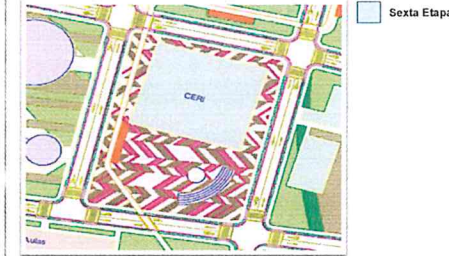

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección: Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, C.P. 45200 Nextipac, Zapopan, Jalisco México. Postal:

FOTOS



F1 - Actual:



F2 - Actual:

Observaciones: (11)
Se muestran los alcances del contrato.



F3 - Actual:



F4 - Actual:



F5 - Actual:

[Signature]
Ing. Esteban Sepúlveda Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Mtra. Karla Rodríguez Contreras
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Dr. Ricardo Villanueva Lemeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adedicaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
