

2019



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE DESCRITIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

Nombre: Mtra. Paola Lycette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

Prioridad	Nombre del proyecto	Planeación				RESPONSABLES				Observaciones	GLOBAL DEL PROYECTO	OBRA CONCLUIDA						
		Obra de continuidad	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados			Si ya fue inaugurada	Cuenta con Actas	Entrega- Recopilación (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recopilación	Monto de Acta Administrativa		
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	Obra no iniciada	Suministro y colocación de acero estructural, cubierta de losa-acero, instalaciones hidrosanitarias.	0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para finalizar el inmueble en su totalidad)		
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X		\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas/ salones	1	45.53	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
3	P-3 Construcción de edificio bicielíptico de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anáhuac (CUCOSTASUR) FAM 2019	X		\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sustentables: pvc con contenido de biobasas, polipropileno, polibutileno y polietileno)	1	1045.55	Obra no iniciada	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Técnicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/ salones	14	850.00	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	1	82.34	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORT) FAM 2019	X		\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Oficinas administrativas	6	286.00	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X		\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Aulas/ salones	7	408.31	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCIE) FAM 2019	X		\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Laboratorios	1	136.17	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCIE) FAM 2019	X		\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Bibliotecas	1	82.34	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X		\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Oficinas administrativas	3	286.00	Obra no iniciada		0	31/07/19	31/12/19	La IES esta en espera que Gobierno del Estado le transfiera los recursos.			
				\$ 45,565,253.93	\$ 0.00	\$ 45,565,253.93												

De:

Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada

Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

	PRIORIDAD 1	Nombre de la obra: P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		
REFERENCIA DE FOTOS EN CROQUIS		
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		
C. Ramón Padilla Sánchez #2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México		
FOTOS		
		Comentarios de los trabajos realizados: 1.- Se muestran imágenes del suministro y colocación de acero estructural de la última Etapa.
<small>Dr. Raúl Gómez Villanueva Jiménez Rector General de la Universidad de Guadalajara</small>		<small>Ing. Esteban Sierra Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara</small>
<small>Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES</small>		

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019


FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

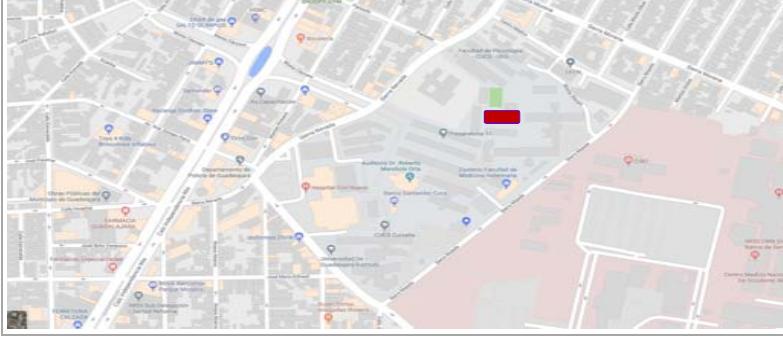 Escudo de la universidad	PRIORIDAD 2	Nombre de la obra: P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
 Referencia de fotos en croquis			UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
FOTOS			
 F1: Planta 1er Nivel	 F2: Planta 2do Nivel	Comentarios de los trabajos realizados: Obra en proceso de restructuración	
 F3: Planta 3er Nivel	 F4: Planta 1er Nivel	 F5: Planta 2do Nivel	
 Dr. Esteban Villanueva Tomelli Rector General de la Universidad de Guadalajara		 Ing. Esteban Sepura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara	
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.			

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance
0



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,
 Independencia Nacional #151
 C.P. 48900, Autlán, Jalisco, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior




F4: Entrada



F5: Interior de aula



Dr. Ricardo Villanueva Esquivel
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

	PRIORIDAD 4	Nombre de la obra: P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 			UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México
FOTOS			
		Comentarios de los trabajos realizados: Obra no iniciada	
<small>Dr. Ricardo Manueña Lomeli Rector General de la Universidad de Guadalajara</small>		<small>Ing. Esteban Serrata Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara</small>	
<small>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.</small>			

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
0


PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

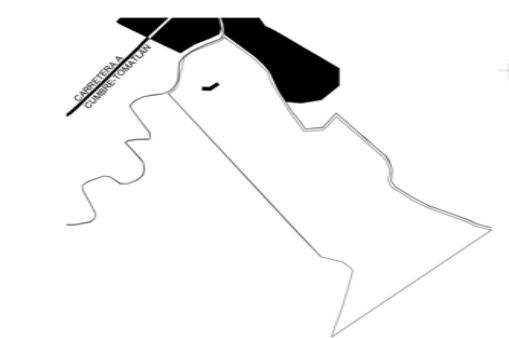

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lemell
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escudo de la universidad	PRIORIDAD 6 Nombre de la obra: P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Referencia de fotos en croquis		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México
FOTOS				
 F1: Fachada principal	 F2: lateral	Comentarios de los trabajos realizados: Obra no iniciada		
 F3: Fachada posterior	 F4: Entrada	 F5: Interior de aula		
 Dr. Ricardo Almanza Lomeli Rector General de la Universidad de Guadalajara		 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara		
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.				

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

7

Nombre de la obra:


P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

0

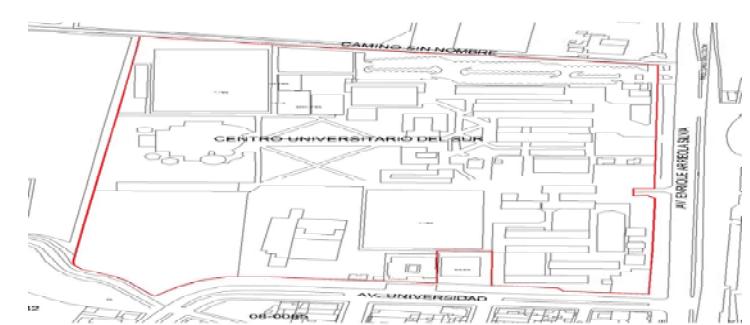

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

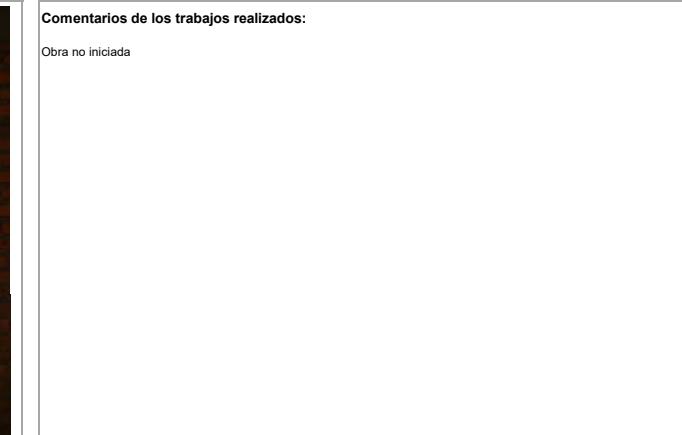

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sepúlveda Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra:


P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

0

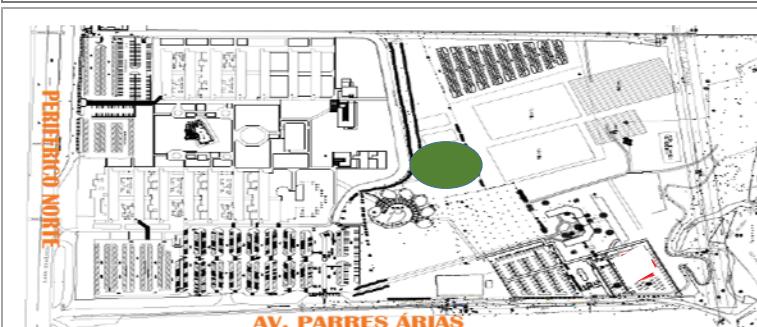

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal

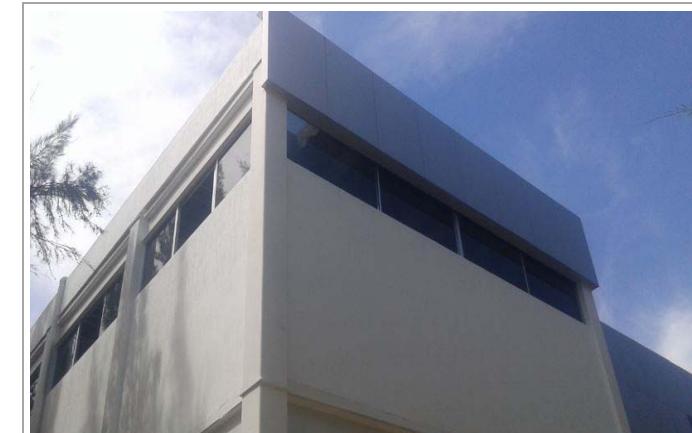

F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Domínguez
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

J. Esteban Sepúlveda Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

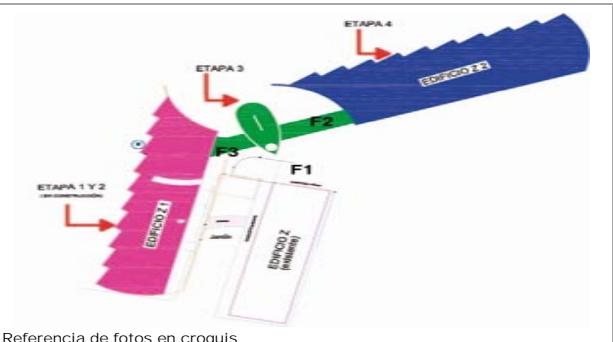

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,
 Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,
 Jalisco.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior

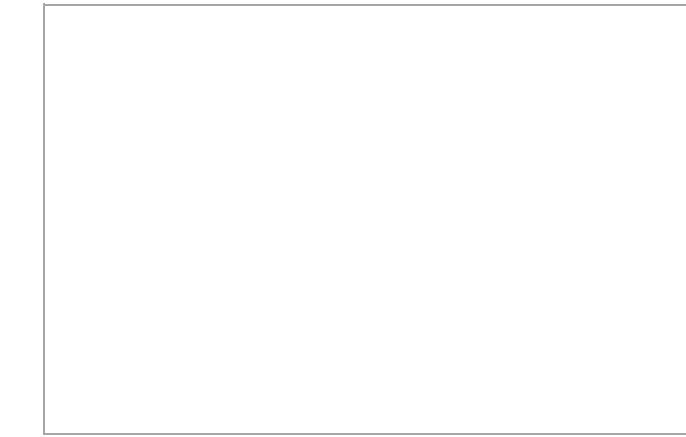


F4: Entrada

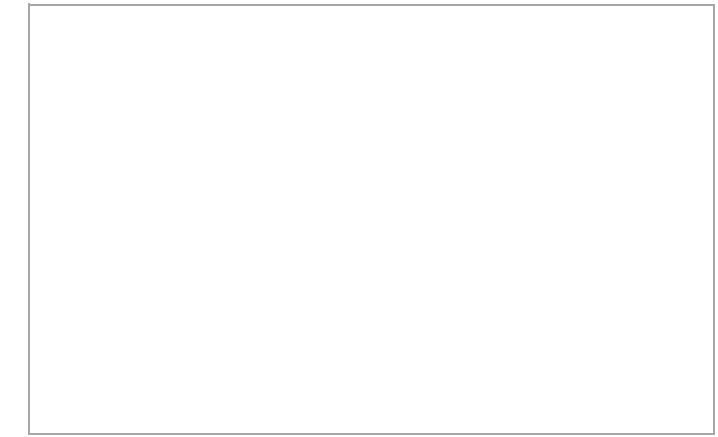

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Solís
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sotura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio
 FECHA DE CORTE: 25/06/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
0



PRIORIDAD

10

Nombre de la obra:

P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

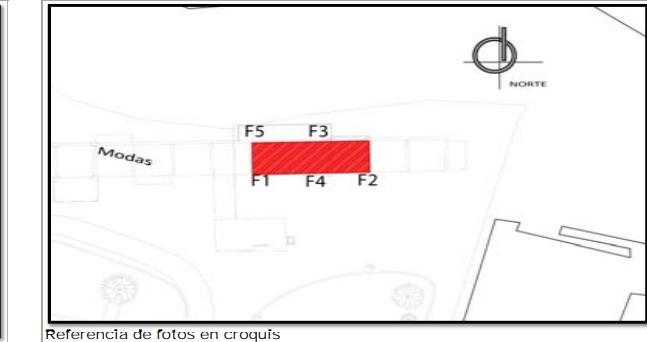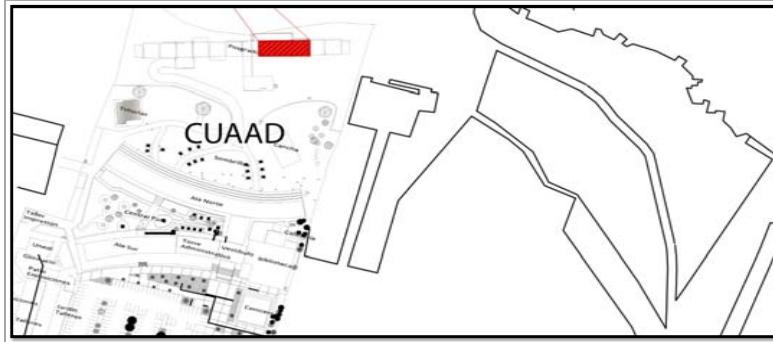

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col. Huentitán
 El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.


FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

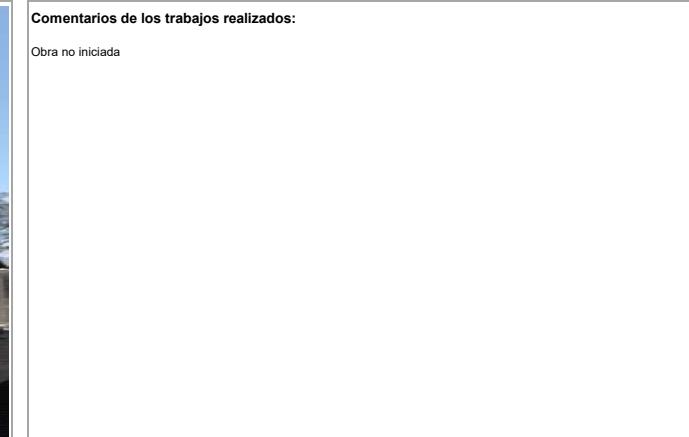

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada

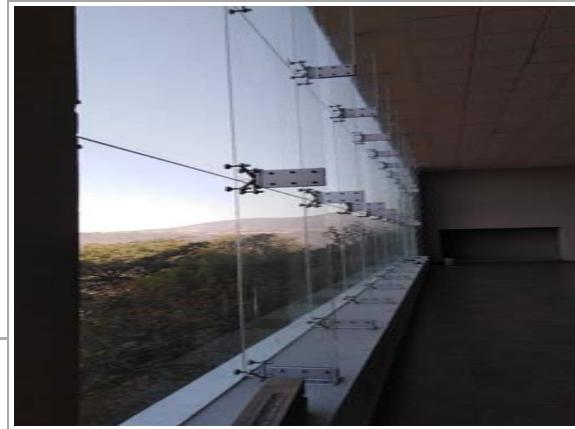

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



Dr. Ricardo Villanueva Momell
 Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
