

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

1er Trim. 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez  
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202  
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada  
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802  
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	P-1 Continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural universitario de la Universidad de Guadalajara.	X				\$13,702,427.68			Talleres	3	109.86			0	01/06/21	31/12/21	En proceso de radicación de recursos ante la Hacienda Pública Estatal							
									Laboratorios	4	1015.27													
									Auditorio	1	352.20													
									Oficinas académicas	2	129.96													
									Oficinas administrativas	4	984.90													
									Aulas didácticas	3	225.20													
									Sanitarios	14	607.40													
									Áreas comunes	21	8921.72													
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>12346.51</b>	GLOBAL DEL PROYECTO																					
2	P-6 Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA)	X				\$21,500,000.00			Aulas/salones	10	700.00			0	01/06/21	31/12/21	En proceso de radicación de recursos ante la Hacienda Pública Estatal							
									Cubículos	25	1450.00													
									Bibliotecas	1	140.00													
									Oficinas académicas	10	700.00													
									Oficinas administrativas	10	700.00													
									Centros de cómputo	8	560.00													
									Aulas usos múltiples	3	210.00													
									Sanitarios	12	320.00													
									Áreas comunes	6	120.00													
									<b>TOTAL</b>	<b>85.00</b>	<b>4900.00</b>													
						\$35,202,427.68	\$0.00	\$0.00																

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

1er Trim. 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**P-1 Continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

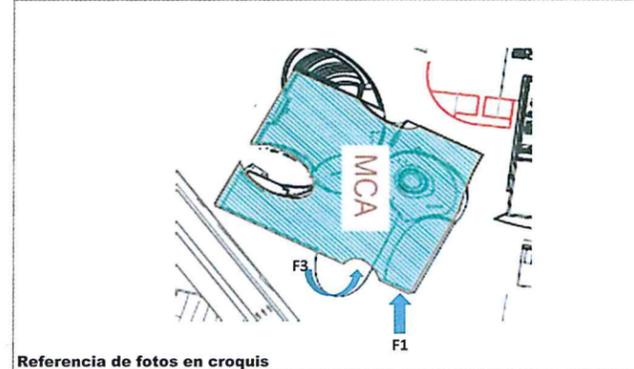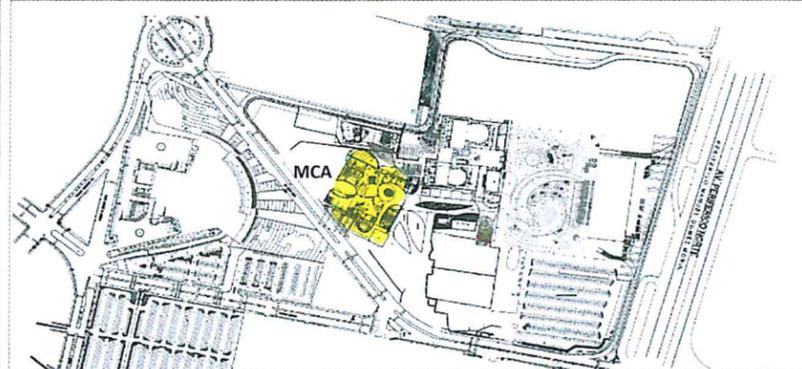

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco.

FOTOS



F1.- Actual: azotea estructura de concreto y escalera




F2.- Actual: Azotea

Comentarios de los trabajos realizados:

Actualmente se están construyendo en la obra del Museo de Ciencias Ambientales con recursos de otra fuente de inversión: en el nivel de galerías la tercera etapa de la construcción de acabados y la cuarta etapa de instalaciones, además de la cuarta etapa de la construcción de andadores en la azotea.

se realizara con este fondo la cuarta etapa de construcción de los acabados y quinta etapa de instalaciones en el nivel de galerías así como la construcción de la quinta etapa de construcción en los andadores y acabados en la azotea del Museo.

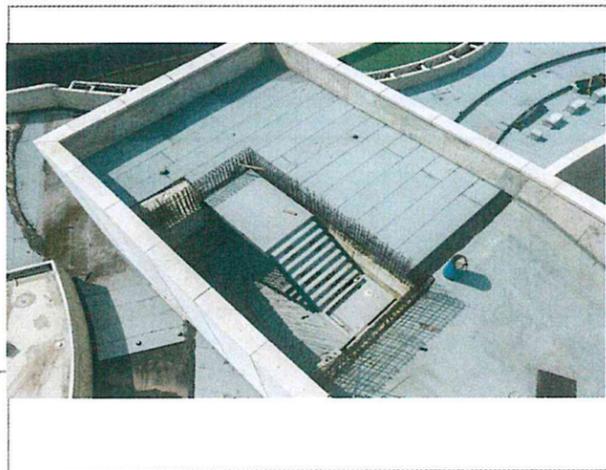

F1.- Actual: azotea estructura de concreto y escalera



F2.- Actual: acabados e instalaciones

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados  
**1er Trim. 2021**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance  
**0**

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **P-6 Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

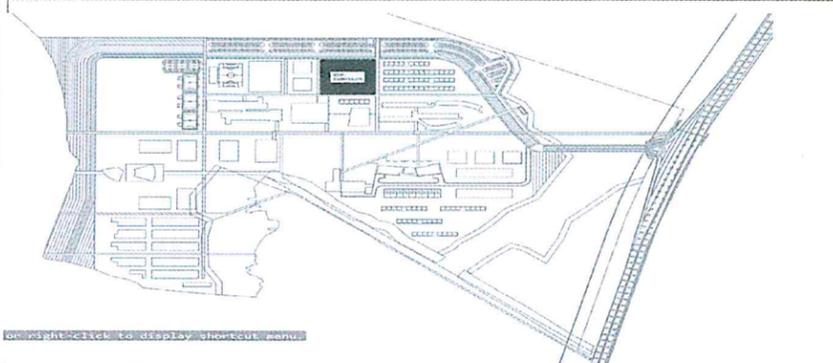


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS




F1: Fachada principal

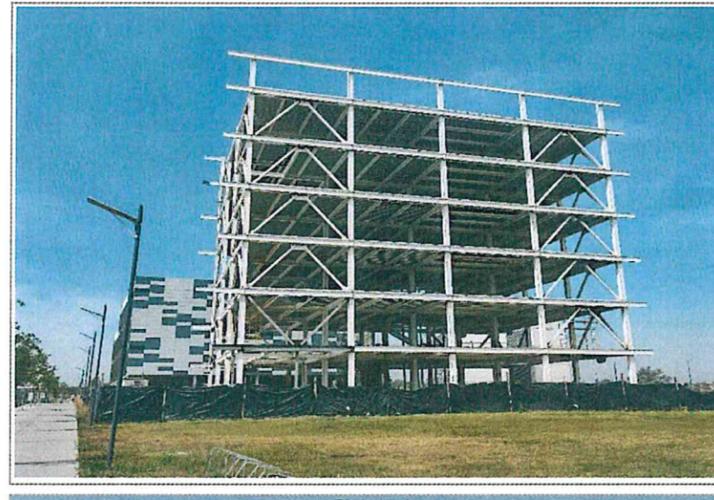


F2: Lateral



F3: Fachada posterior

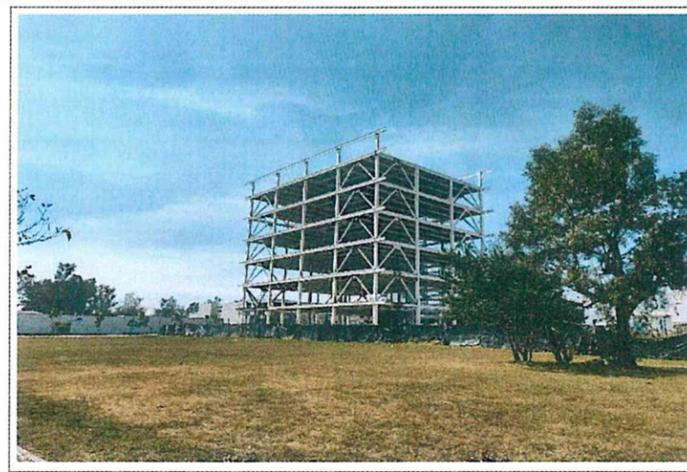

F4: Entrada

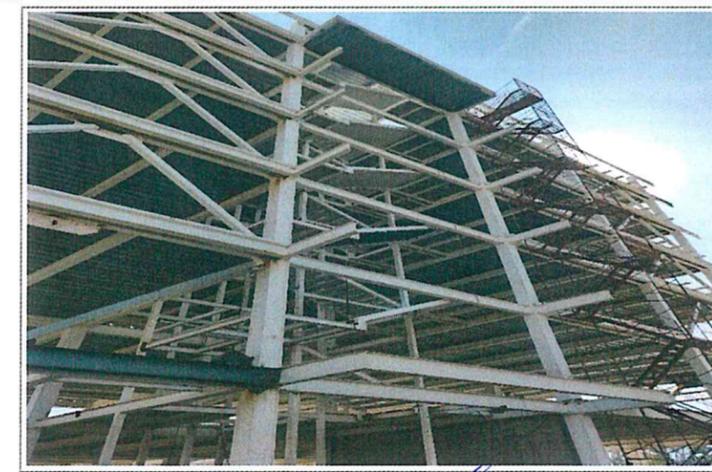

F5: Fachada

Comentarios de los trabajos realizados:

Dr. Ricardo Milaneva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
