

2024



EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: 1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Clave 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rafael Serrano González
Cargo: Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: rafael.serrano@cgpe.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns for project details, contract info, execution dates, amounts, and completion status. Includes sub-tables for physical spaces and real dates.

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtro. Rafael Serrano González
Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Kater Alejandra Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD


1

Nombre de la obra: Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Quinta etapa de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos).


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)

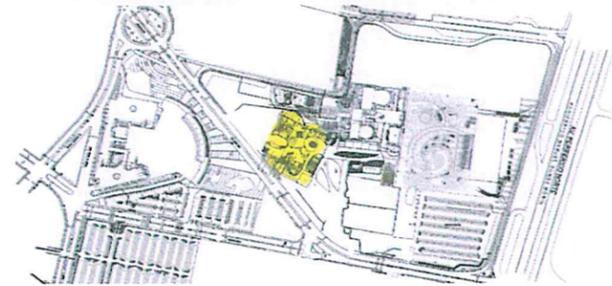

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco

FOTOS



Estado Actual Nivel Azotea



Estado Actual Nivel Azotea



Estado Actual Nivel Galerías



Estado Actual Nivel Galerías



Observaciones :

(11)

Contratos finiquitados, correspondiente al suministro e instalación de salidas eléctricas, de iluminación y contactos en los niveles galerías, restaurante y azotea, canalizaciones para servicios de voz y datos CCTV y control de accesos en todo el recinto. Suministro de equipos para voz y datos y CCTV.

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtro. Rafael Serrano González
Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (16va Etapa) en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. (CUCS)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)

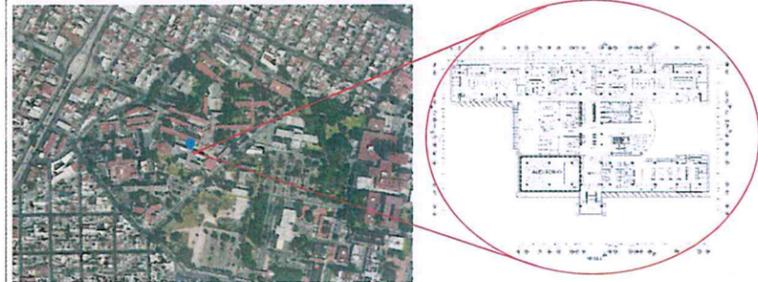

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

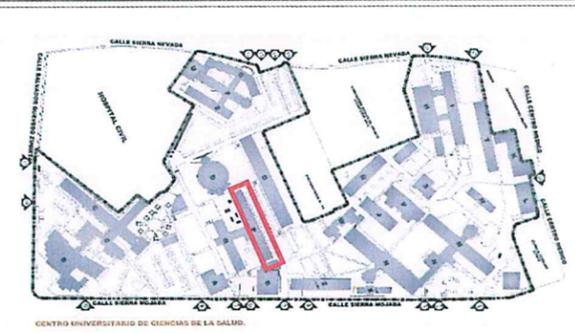

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

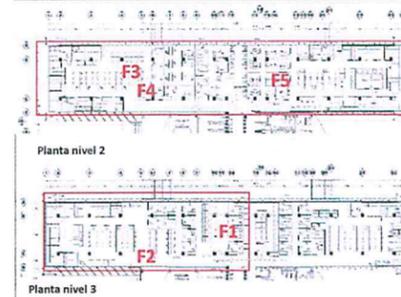

Dirección Postal: Sierra Mojada 950, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.


FOTOS



F1.- Actual: NIVEL 3



F2.- Actual: NIVEL 3

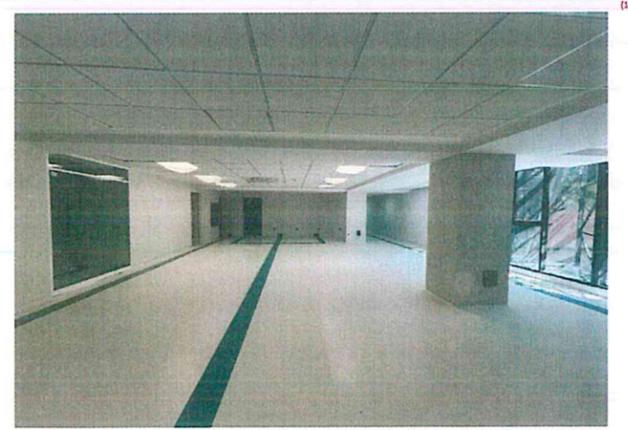

F3.- Actual: NIVEL 2



F4.- Actual: NIVEL 2

Observaciones : (11)
Los trabajos correspondientes al contrato fueron actividades en instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de aire acondicionado, acabados en pisos, muros y plafones, ademas de trabajos de voz y datos, cctv y contraincendios.



F5.- Actual: NIVEL 2

Signature of Mag. Esteban Segura Estrada, Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara.

Signature of Mtro. Rafael Serrano González, Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara.

Signature of Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara.

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: Suministro e instalación de sistema fotovoltaico Interconectado a Red en el Museo de Ciencias Ambientales


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)

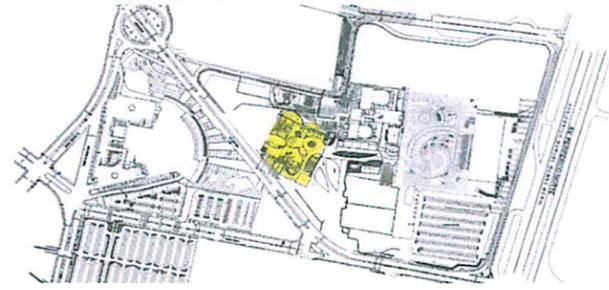

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

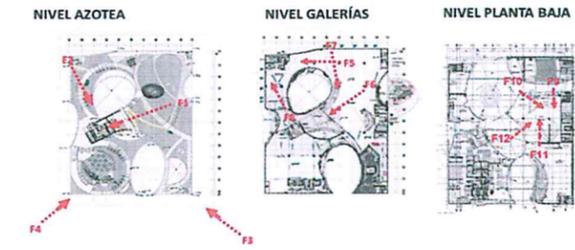

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco

FOTOS




Estado Actual Nivel Azotea



Estado Actual Nivel Azotea


Observaciones :
Suministro y colocación de paneles fotovoltaicos interconectado a la red en pérgolas existentes

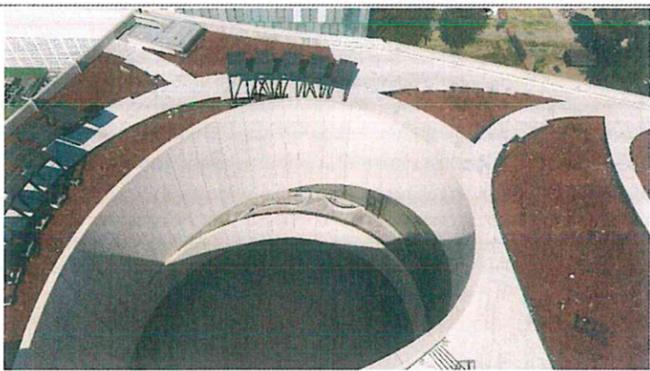

Estado Actual Nivel Azotea



Estado Actual Nivel Azotea

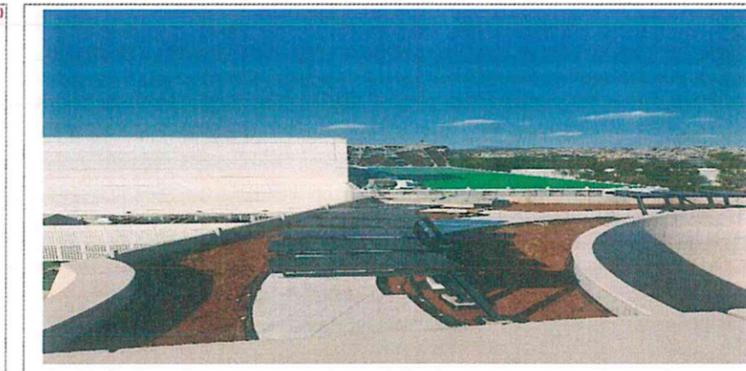

Estado Actual Nivel Azotea

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

Mtro. Rafael Serrano González
Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados. (CUCEA) Primera etapa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

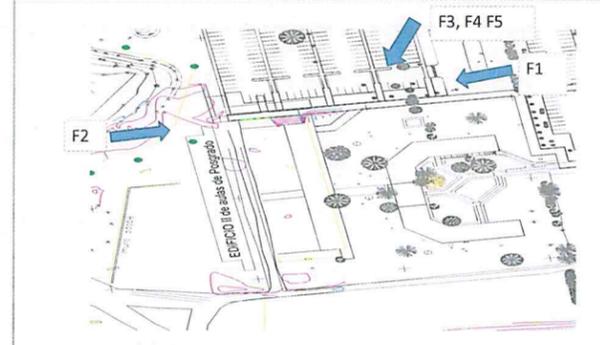


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes, 45100 Zapopan, Jal.

FOTOS

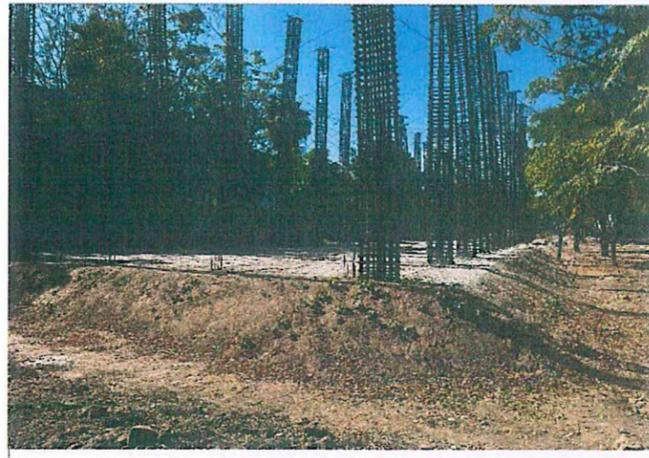

F1.- Actual:



F2.- Actual:

Observaciones : (11)
Se muestran los alcances de la primer etapa de cimentación



F3.- Actual:



F4.- Actual:



F5.- Actual:

[Signature]
Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Mtro. Rafael Segura González
Secretario de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara

[Signature]
Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
